

Untitled Gantt Project

24 abr 2026

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

11 abr 2026 - 23 may 2026

Progreso

37%

Tarea

59

Recursos

4

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Costo
Fundación del proyecto	11/04/26	14/04/26	100	5.120
Crear repo con tag v1.0.0.	11/04/26	11/04/26	100	120
Plan del Proyecto aprobado	11/04/26	13/04/26	100	1.800
Solución .NET 10 + ASP.NET Core	12/04/26	12/04/26	100	480
Configuración del motor gráfico	12/04/26	12/04/26	100	560
EF Core configurado con Code-First (sustituyendo el .edmx database-first)	12/04/26	12/04/26	100	720
10 entidades migradas (user, match, card, inventory, etc.)	13/04/26	13/04/26	100	720
Pipeline de migraciones de base de datos funcional	14/04/26	14/04/26	100	720
Infraestructura lista para comenzar a desarrollar	14/04/26	14/04/26	100	0
Autenticación y perfil operativos	14/04/26	23/04/26	100	6.920
16 endpoints REST (registro, login, perfil)	14/04/26	17/04/26	100	2.160
Registro completo (con verificación por email)	14/04/26	14/04/26	100	720
Login / Logout / Sesiones de invitado	16/04/26	16/04/26	100	720
Perfil (avatar, username, etc.)	17/04/26	17/04/26	100	720
Manejo de sesiones con tokens (reemplaza userSession de WCF)	18/04/26	18/04/26	100	360
Desarrollo de Interfaz UI (Auth)	18/04/26	19/04/26	100	800
Pruebas de SessionServiceTest migradas	19/04/26	19/04/26	100	480
Integración API REST (Auth)	18/04/26	20/04/26	100	1.680
Ejecución de pruebas unitarias de Dominio	21/04/26	23/04/26	100	1.440
Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil	22/04/26	22/04/26	100	0
Social y estadísticas operativos	23/04/26	28/04/26	37	3.960
12 endpoints REST (amigos, historial)	23/04/26	24/04/26	100	1.440
Amigos (solicitar, aceptar/rechazar, listar)	23/04/26	23/04/26	100	720
Redes sociales: agregar, eliminar	24/04/26	24/04/26	100	360
Historial de partidas, reportar usuario	24/04/26	24/04/26	100	360
Desarrollo de Interfaz UI (Social)	25/04/26	26/04/26	0	960
Integración API REST (Social)	25/04/26	25/04/26	0	480
Pruebas de SocialCore y StatisticsCore migradas	28/04/26	28/04/26	0	480
Documentación de API REST (Social/Estadísticas)	25/04/26	25/04/26	0	600
El sistema social está completo	28/04/26	28/04/26	0	0

Tarea

3

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Costo
Lobby en tiempo real operativo	29/04/26	06/05/26	0	10.320
Hub SignalR implementado (reemplaza IGameLobbyCallback)	29/04/26	30/04/26	0	1.440
9 callbacks migrados a eventos SignalR	01/05/26	04/05/26	0	4.800
Migración de callbacks (Chat, PlayerJoined/Left, UpdatePlayerList)	01/05/26	01/05/26	0	960
Migración de callbacks (VoteToKick, Emails)	01/05/26	04/05/26	0	3.840
Documentación de la nueva arquitectura en tiempo real (SignalR vs WCF)	03/05/26	03/05/26	0	800
Desarrollo de Interfaz UI (Lobby)	01/05/26	01/05/26	0	480
Integración SignalR en Godot (Lobby)	01/05/26	04/05/26	0	1.600
Gestión de lobbies y estado de sesiones de juego	05/05/26	05/05/26	0	800
Pruebas de LobbyServiceTest migradas	06/05/26	06/05/26	0	400
Callbacks WCF reemplazados con SignalR	06/05/26	06/05/26	0	0
Lógica de juego operativa	01/05/26	16/05/26	0	6.760
Desarrollo de Interfaz UI (Tablero)	01/05/26	02/05/26	0	800
Flujo de juego completo vía SignalR	07/05/26	10/05/26	0	2.400
StartGame, FlipCard, turno, puntuación, fin de partida	07/05/26	08/05/26	0	1.200
ShowCard, HideCards, CardFlipped, SetCardsAsMatched, UpdateScore	09/05/26	10/05/26	0	1.200
Animación y Lógica de Juego (SignalR)	11/05/26	15/05/26	0	2.000
Pruebas de GameServiceTest migradas	15/05/26	15/05/26	0	560
Documentación del flujo de juego y estados del cliente	15/05/26	16/05/26	0	1.000
El juego funciona end-to-end	16/05/26	16/05/26	0	0
Validación y cierre	07/05/26	22/05/26	0	6.080
Documentación de la Arquitectura del Cliente	07/05/26	07/05/26	0	560
Todas las pruebas pasando (32 clases de test)	17/05/26	17/05/26	0	1.520
Prueba de regresión funcional completa	17/05/26	17/05/26	0	560
Secrets/configuración segura (email, cadena de conexión fuera de config)	18/05/26	18/05/26	0	600
Manual de despliegue en infraestructura Linux	19/05/26	20/05/26	0	1.000
Documentación técnica final (gestores)	21/05/26	21/05/26	0	700

Tarea

4

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Costo
Tag v2.0.0 + Release en GitHub	22/05/26	22/05/26	0	1.140
Sistema estable y entregable	22/05/26	22/05/26	0	0

Recursos

Nombre	Función
Isa Gabriela Torres Garcia	Desarrollador
Jorge Irán Pérez Segovia	Documentador
Luis Donaldo Ortiz Garcia	Desarrollador
Diego Ivan Enriquez Morales	Tester

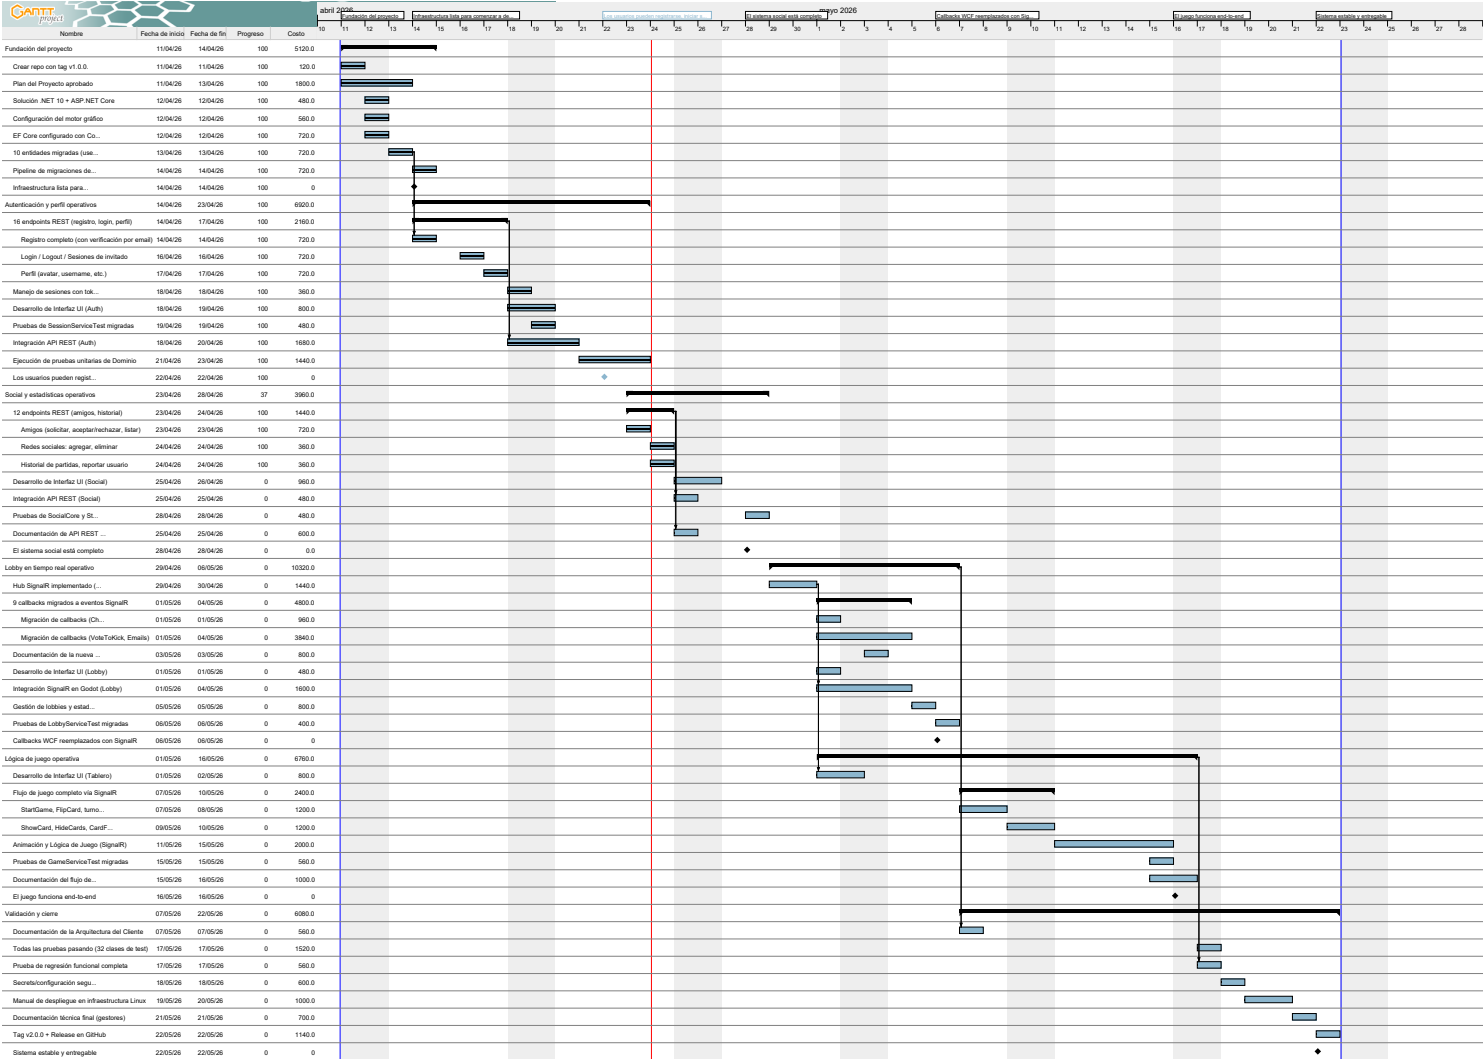


Diagrama de recursos

